



## COMITÉ DE OBRA No. 39 - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATAR LA OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE PICALAÑA IBAGUE COMPRENDIENDO LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, GASES MEDICINALES, HIDROSANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION, ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, DOMOTICA Y LLAMADO DE ENFERMERAS

**AVANCE DE TOTAL 89,81%**

**Avance de obra 75,80 %**

**Avance financiero 14,01%**

9. PISOS 95,58%

NP. PISO ANTIDESLIZANTE 80,00%



# 10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE

90,77%



# 11. CARPINTERIA METALICA 17,23%



## 15. PINTURA 45,18% (estuco 90,00%)



## 16. MUEBLES ESPECIALES - 67,11%



# 17. OBRAS EXTERIORES 88,55%



# HIDROSANITARIO Y REDES DE EVACUACION AGUAS RESIDUALES - 85,99%



# ELECTRICO 72,96%



# NP. 74 CIELO RASO EN PVC 45,81%




# CERRAMIENTO TUBULAR 71,04%



# MESONES EN ACERO INOXIDABLE 40,70%



# PORCENTAJE EJECUTADO VS PROGRAMADO

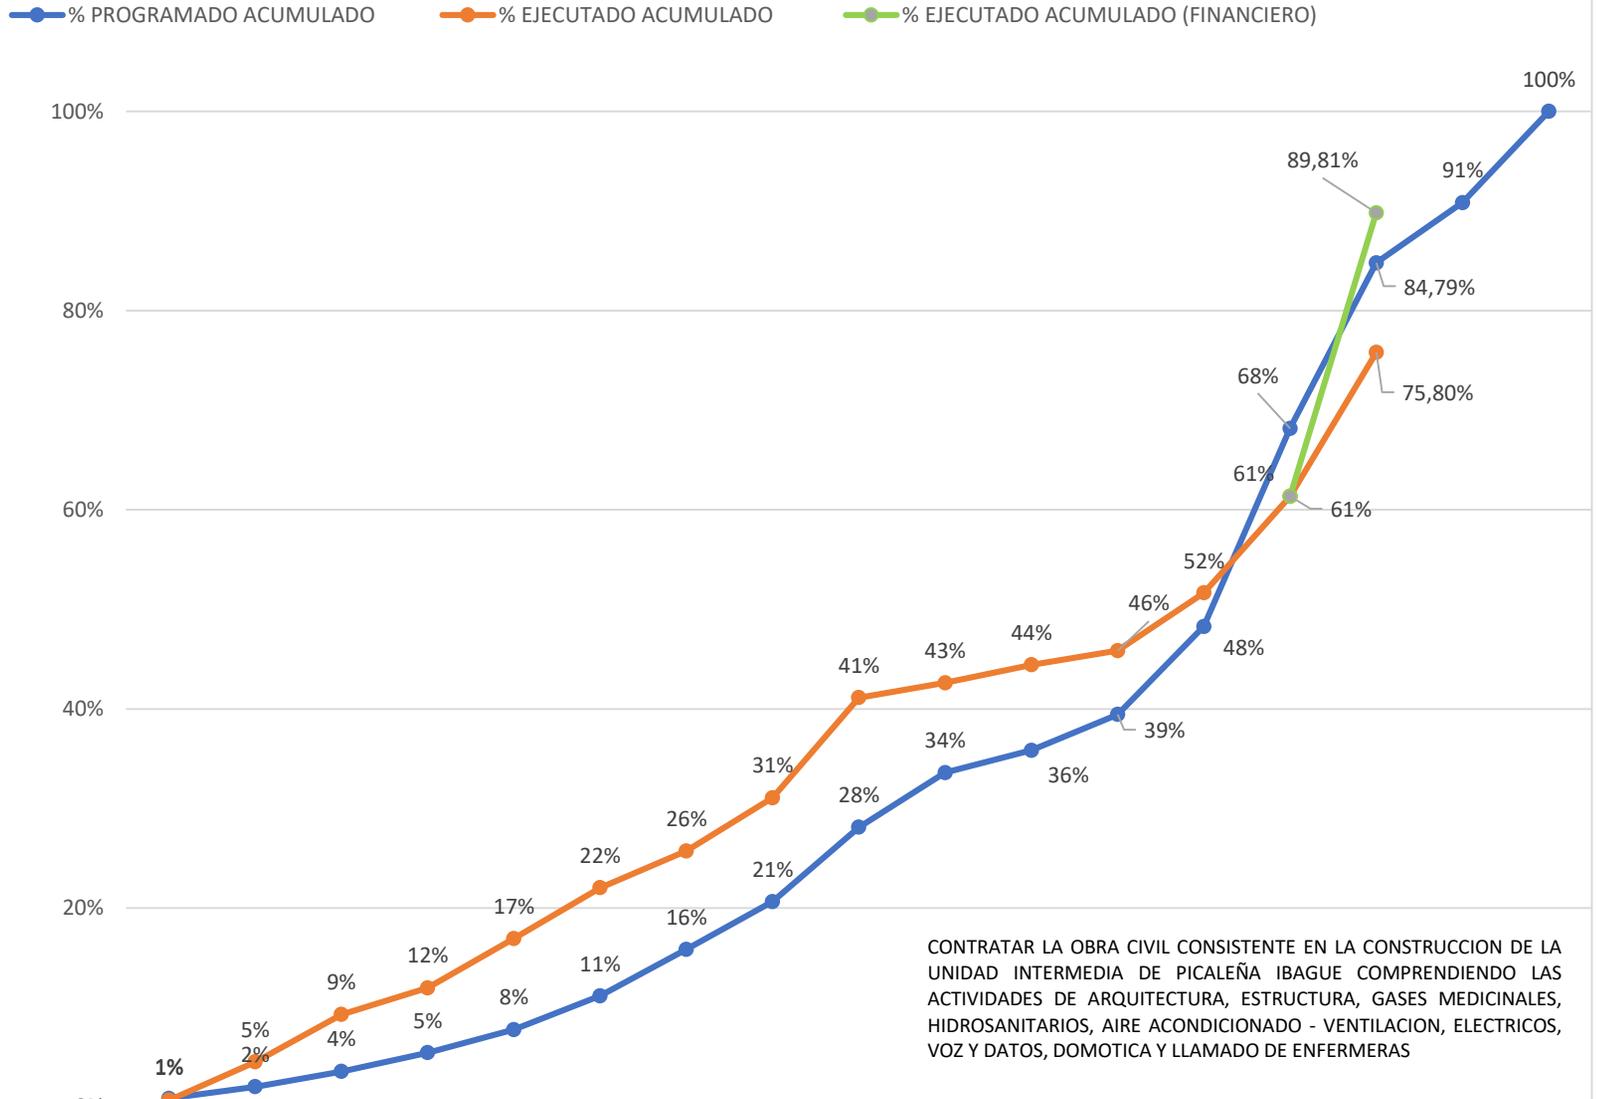

CONTRATAR LA OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE PICALÉÑA IBAGUE COMPRENDIENDO LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, GASES MEDICINALES, HIDROSANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION, ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, DOMOTICA Y LLAMADO DE ENFERMERAS



	julio(12.07.2021-30.07.2021)	agosto(01.08.2021-31.08.2021)	septiembre(01.09.2021-30.09.2021)	octubre(01.10.2021-31.10.2021)	noviembre(01.11.2021-30.12.2021)	diciembre(01.12.2021-31.12.2021)	enero(01.01.2022-31.01.2022)	febrero(01.02.2022-28.02.2022)	marzo(01.03.2022-31.03.2022)	abril(01.04.2022-30.04.2022)	mayo(01.05.2022-31.05.2022)	junio(01.06.2022-30.06.2022)	julio(01.07.2022-31.07.2022)	agosto(01.08.2022-31.08.2022)	septiembre(01.09.2022-30.09.2022)	septiembre(01.09.2022-30.09.2022)	octubre(01.10.2022-13.10.2022)
<span style="color: blue;">●</span> % PROGRAMADO ACUMULADO	1%	2%	4%	5%	8%	11%	16%	21%	28%	34%	36%	39%	48%	68%	84,79%	91%	100%
<span style="color: orange;">●</span> % EJECUTADO ACUMULADO	1%	5%	9%	12%	17%	22%	26%	31%	41%	43%	44%	46%	52%	61%	75,80%		
<span style="color: green;">●</span> % EJECUTADO ACUMULADO (FINANCIERO)														61%	89,81%		
